


工 事 工 程 表															
工 事 名	保健福祉館空調設備改修工事												工 期		
													自	契約日の翌日	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
準備	事前準備(書類含)						検査準備(書類含)		検査準備(書類含)		検査準備(書類含)		検査準備(書類含)		
仮設	現場仮設等(養生等含)		空調機納期(3.5~4ヶ月)				清掃等	養生等	清掃等	養生等	清掃等	養生等	清掃等	養生等	清掃等
①第1工区 (多目的、中央棟東) ・ほっとすまいるセンター ・多目的ホールLED工事			空調機器更新					事務室移動							
②第2工区 (中央棟西) ・健康増進課事務室 ・社会福祉協議会事務室 ・ボランティアセンター								事務室移動	空調機器更新		事務室移動				
③第3工区 (南ウイング棟) ・あじさい工房 ・軽食喫茶											空調機器更新		事務室移動	事務室移動	
④第4工区 (北ウイング棟) ・ことばの相談室 ・検診室													空調機器更新		事務室移動
検査								検査		検査			検査		検査

工事区域図

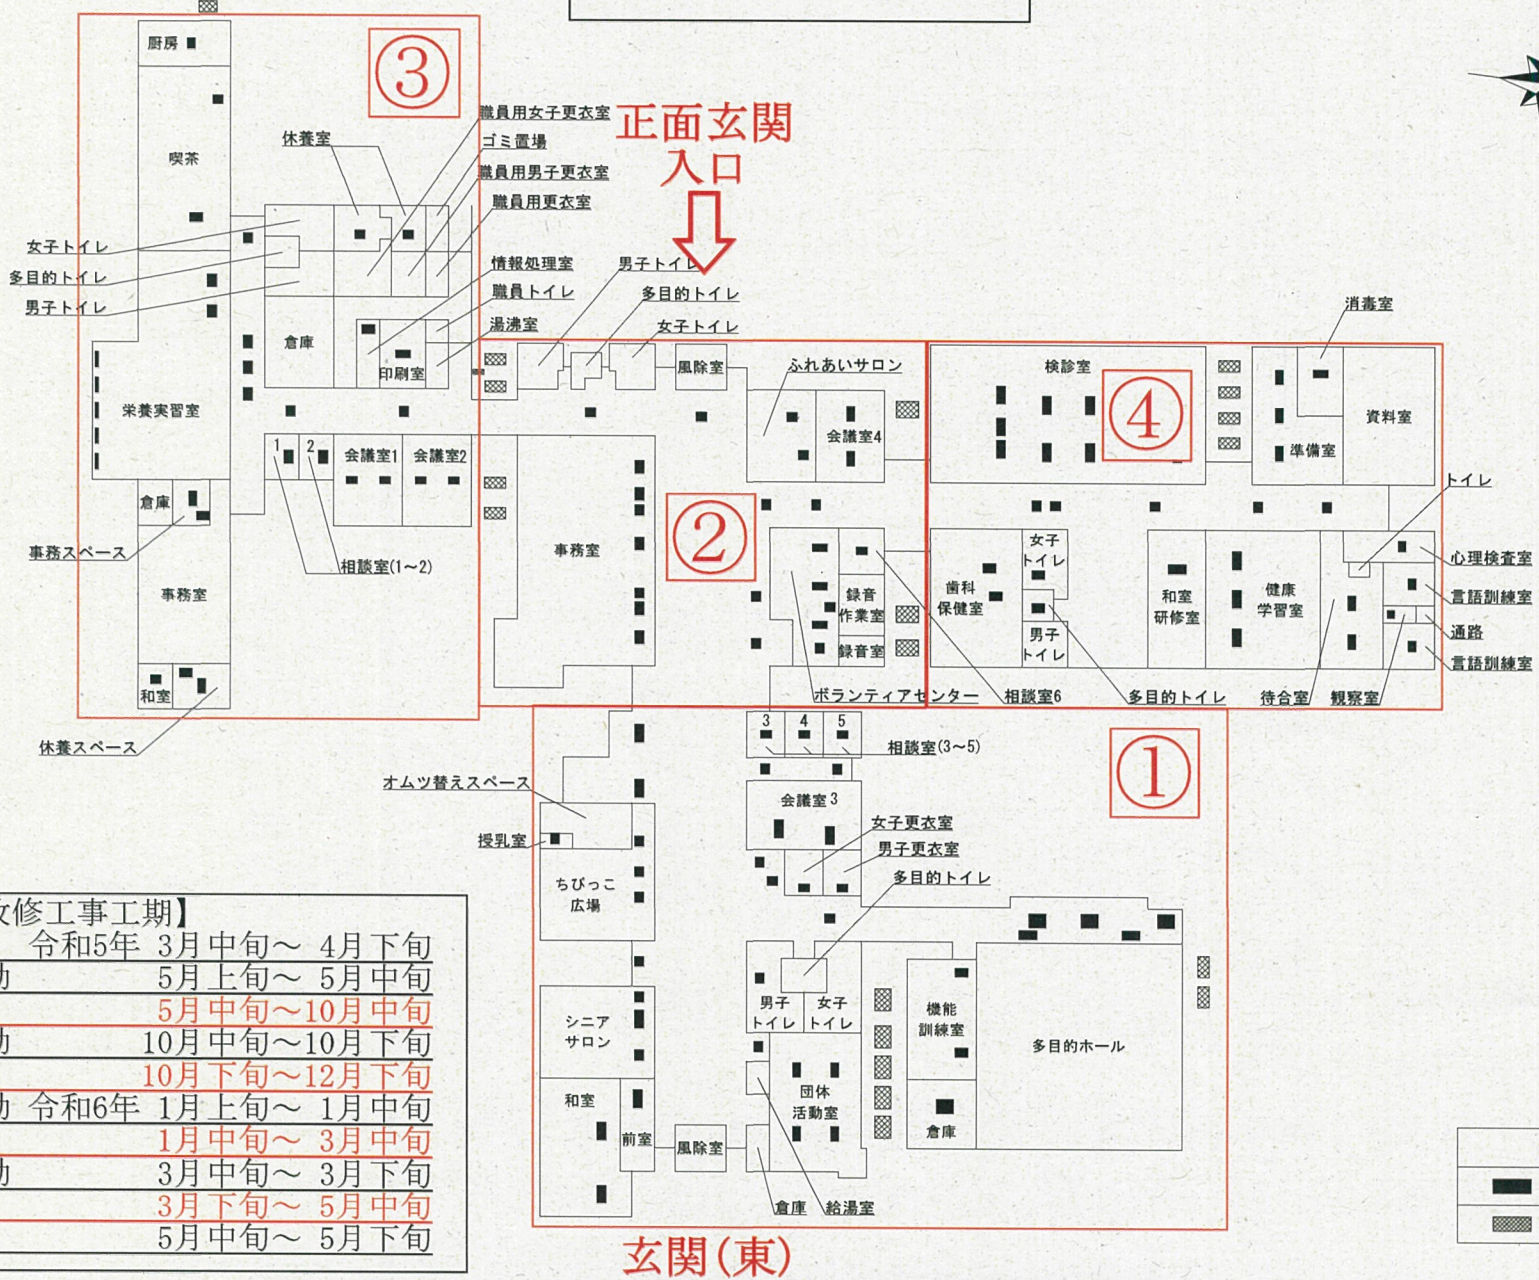

【空調設備改修工事工期】	
事前準備	令和5年 3月中旬～4月下旬
事務所移動	5月上旬～5月中旬
①第1工区	5月中旬～10月中旬
事務所移動	10月中旬～10月下旬
②第2工区	10月下旬～12月下旬
事務所移動	令和6年 1月上旬～1月中旬
③第3工区	1月中旬～3月中旬
事務所移動	3月中旬～3月下旬
④第4工区	3月下旬～5月中旬
完了検査	5月中旬～5月下旬

凡 例	
■	空調室内機
▨	空調室外機

工事期間中の会議室等の移動先

工事区域	工事個所	工事中の移動先
①多目的ホール棟 + 中央棟東 (R5.5中旬 ~R5.10中旬)	多目的ホール	使用休止
	ほっとスマイルセンター	ふれあいサロン
	団体活動室	使用休止
	ゆうゆう倶楽部	
	シニアサロン	
	ちびっこ広場	
	会議室 3	
	相談室 3・4・5	閉鎖
玄関 (東)		

工事区域	工事個所	工事中の移動先
②中央棟西 (R5.10下旬 ~R5.12下旬)	事務室 (健康増進課)	多目的ホール・ 団体活動室
	事務室 (社会福祉協議会)	会議室 1・2
	ボランティアセンター	会議室 3
	録音室	工事時間外に使用
	録音作業室	工事時間外に使用
	会議室 4	使用休止
	相談室 6	
	正面玄関入口	閉鎖

工事区域	工事個所	工事中の移動先
③南ウイング棟 (R6.1中旬 ~R6.3中旬)	軽食喫茶	休業
	栄養実習室	使用休止
	あじさい工房	団体活動室
	相談室 1・2	使用休止
	会議室 1・2	
	印刷室	会議室 4
	倉庫	会議室 4

工事区域	工事個所	工事中の移動先
④北ウイング棟 (R6.3下旬 ~R6.5中旬)	検診室	多目的ホール
	保健学習室	
	歯科保健室	
	消毒室	会議室4
	和室研修室	ゆうゆう倶楽部
	ことばの相談室	発達支援センター
	資料室	会議室 1・2
