


新清掃工場関連付帯施設整備事業
建設予定地



新清掃工場関連付帯施設整備事業 建設予定地の状況

伐採・伐根作業前

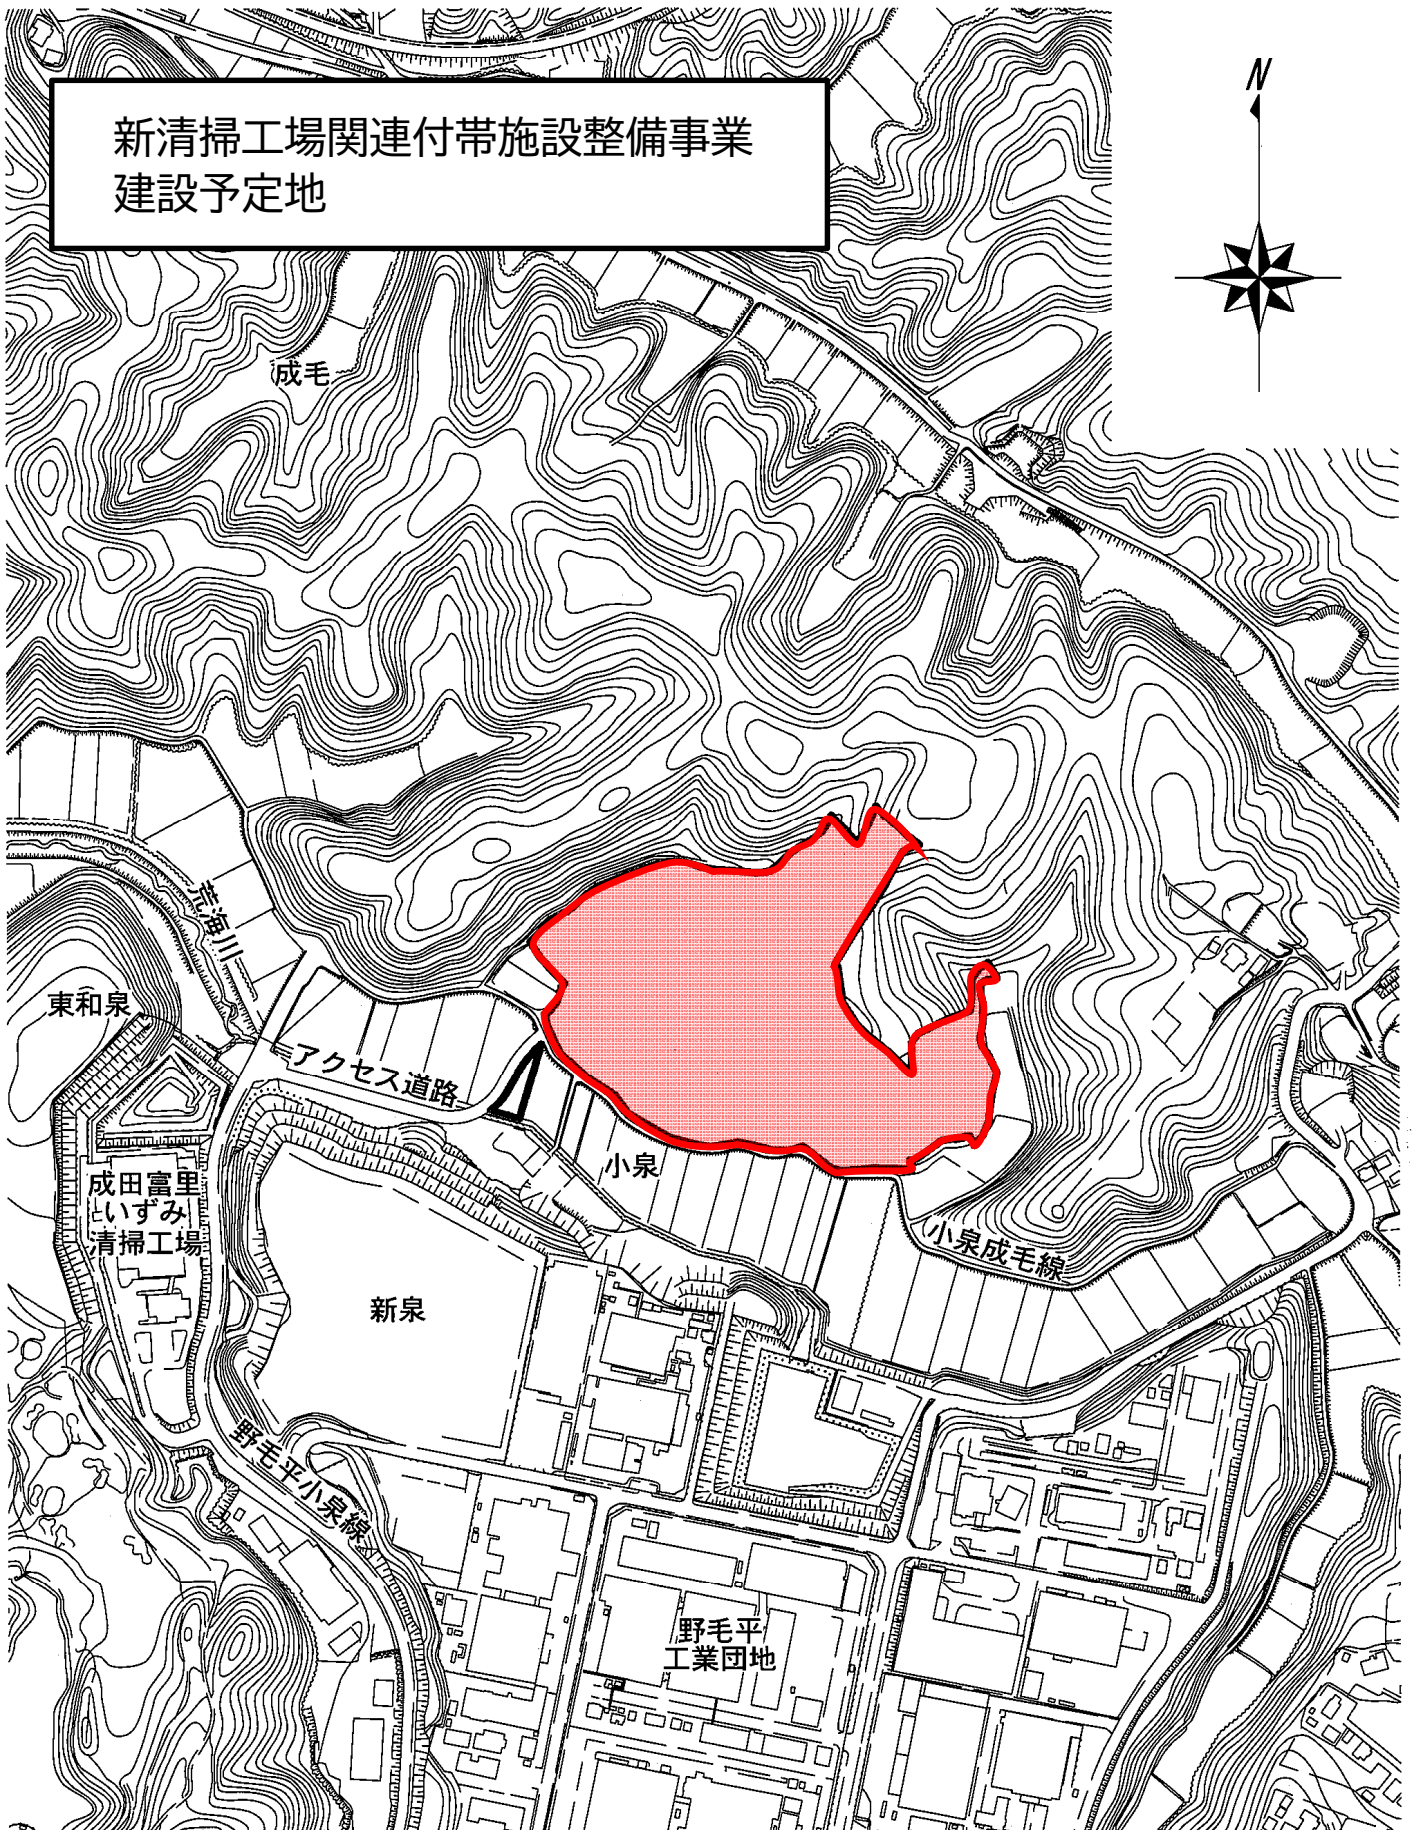

伐採・伐根作業後（現状）



新清掃工場関連付帯施設整備事業

市発注とPFI事業における工事等の工程について

市発注	各事業者施工	P F I 事業
用地造成工事（当初） ↓ 用地造成工事（延長） ↓ 検査・許可等完了確認	※ 用地造成工事で建設 予定地が整地された 段階で温泉掘削の申 請手続きに入ります。	基本設計
高温水管布設工事		実施設計
		許可申請等手続き
		温泉掘削申請手続き
		↓
アクセス道路 排水設備工事 ↓ アクセス道路 路盤工事 ↓ アクセス道路 照明工事 ↓ アクセス道路 舗装工事	ガス関連工事 その1 （市負担あり）	温泉掘削工事
		↓
		基礎・躯体工事
		↓
		設備工事
		↓
		内・外装工事
		↓
遊歩道整備工事		外構工事
		↓
		什器・備品納入
		↓
熱交換器設置工事 高温水循環試運転	ガス関連工事 その2 （市負担あり）	検査
		↓
		開業準備
		↓
		運営・維持管理

注）工程をわかりやすく説明するため、記載を省略している工程があります。また、実際は同時進行する工程や順番を入れ替えて施工する工程があります。
