

## 大栄地区小中一体型校舎の建設について

○工事期間 平成 29 年度から平成 34 年度まで

○開校目標 平成 33 年度

## ○施設概要

計画地 成田市伊能 125 番地（現大栄中学校敷地内）  
敷地面積 63,979 m<sup>2</sup>（緑地 9,154 m<sup>2</sup>を含む）  
建築面積 7,411 m<sup>2</sup>（校舎・体育館） [建築確認申請中]  
延べ床面積 14,096 m<sup>2</sup>（校舎・体育館） [建築確認申請中]  
構造 地上 3 階建て、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（校舎・体育館）  
校舎 普通教室 21 室、特別支援教室 6 室、ことばの教室、各種特別  
教室、管理諸室など  
体育館 大アリーナ（ステージ）、小アリーナ  
児童ホーム プレイルーム 2 室  
屋外施設 メイングラウンド、低学年運動スペース、多目的練習場、テニ  
スコート、バスロータリーなど

## ○平成 29 年度の整備計画

## ・雨水調整槽整備工事

受注者 千葉県成田市大清水 214 番地 15  
関東機工建設株式会社 代表取締役 小松 茂生  
契約金 194,400,000 円  
工期 平成 29 年 6 月 22 日～平成 30 年 1 月 31 日  
進捗率 43%（10 月末現在）


## ・メイングラウンド整備工事及び付属施設整備工事

予定工期：平成 30 年 2 月～平成 30 年 9 月頃

## ○平成 30 年度以降の整備計画


- ・造成工事 (平成 30 年度中頃～平成 30 年度後半)
- ・校舎・体育館新築工事 (平成 30 年度後半～平成 32 年度中頃)
- ・低学年グラウンド整備工事及び外構・付属棟工事  
(平成 31 年度後半～平成 32 年度後半)
- ・中学校解体工事・西側道路拡幅工事・多目的グラウンド整備工事等  
(平成 33 年度～平成 34 年度)

○事業費 継続費（平成 29 年度～平成 34 年度） 計画事業費 約 74 億円



■凡例

	送迎車動線
	ランニングコース：約1.12km

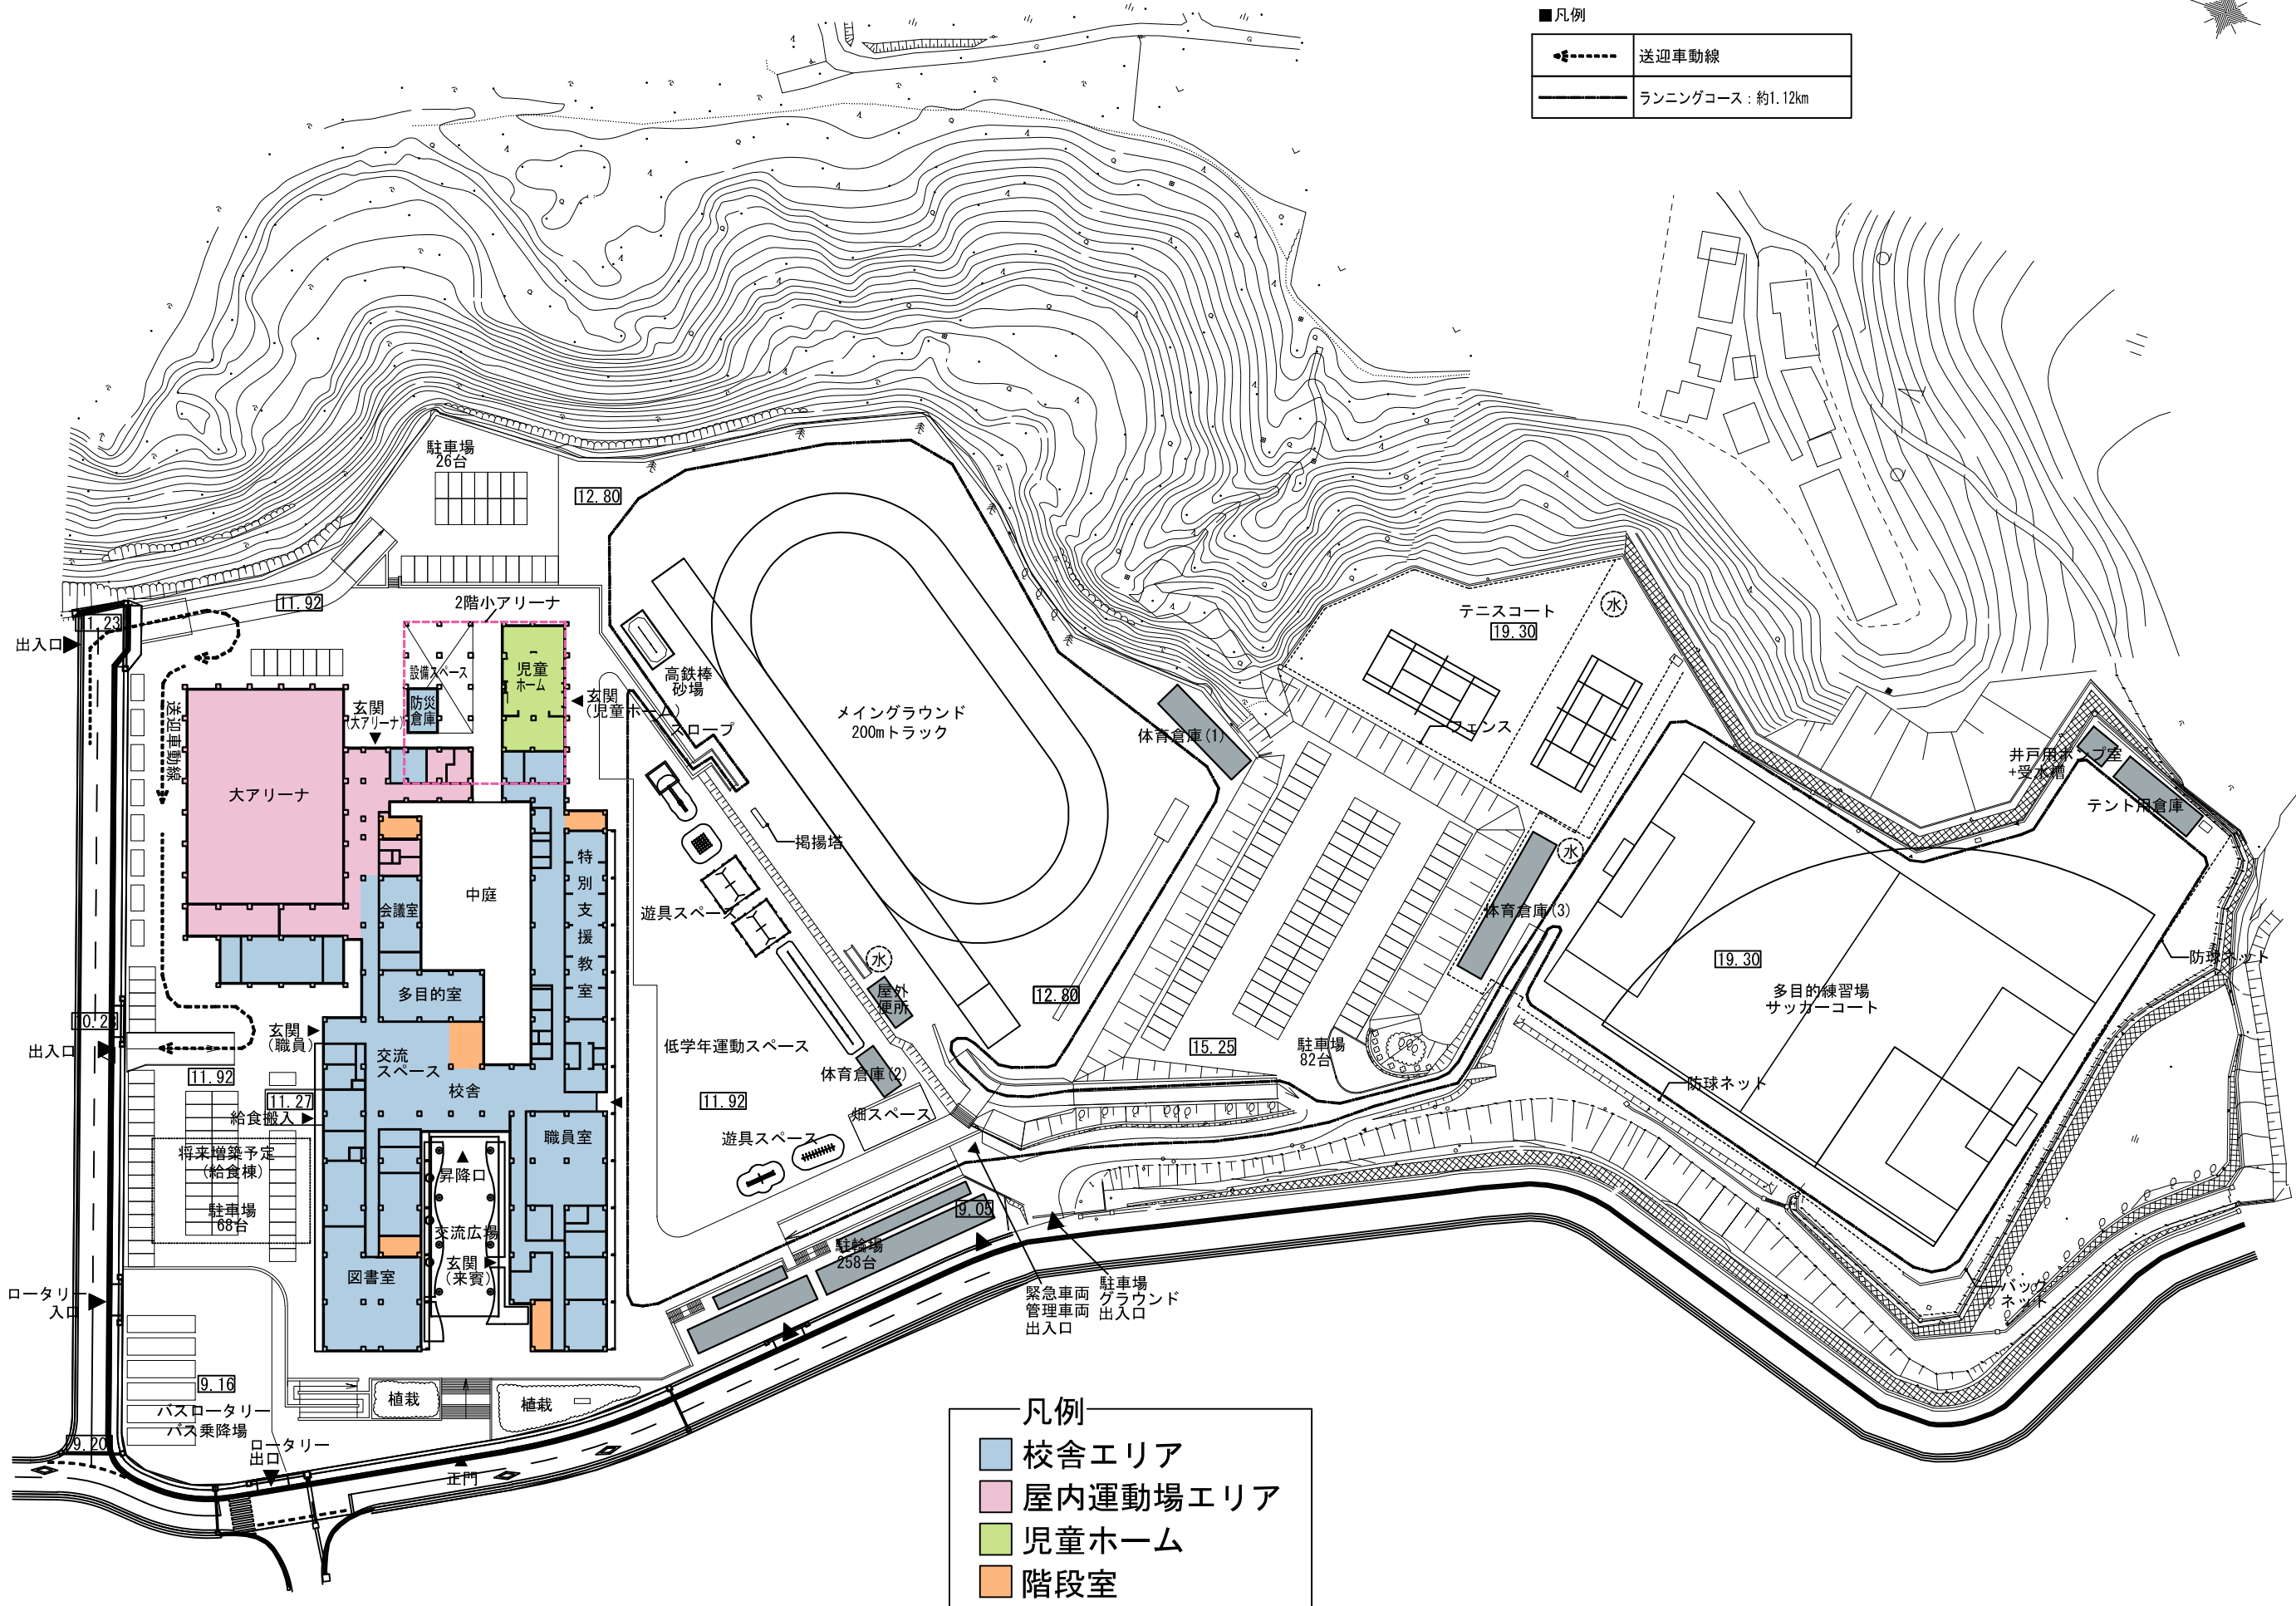

凡例

	校舎エリア
	屋内運動場エリア
	児童ホーム
	階段室





完成イメージ図
